



**ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ**  
**PERSONA FÍSICA**  
**PRESENTE.**

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

- OBRA:** REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA
- UBICACIÓN:** CALLE FRANCISCO MURGUÍA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE
- LOCALIDAD:** FRANCISCO VILLA
- MUNICIPIO:** SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.
- PLAZO DE EJECUCIÓN:** 30 DÍAS
- INICIO DE OBRA:** 31 DE JULIO DE 2025
- TERMINACIÓN DE LA OBRA:** 29 DE AGOSTO DE 2025

- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 25 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

**ATENTAMENTE**  
**SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,**  
**A 21 DE JULIO DE 2025**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO/**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**



**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
Plaza de la Constitución No. 1  
Teléfono de Oficina: 948 888 4330  
2024 - 2027

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230  
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



**C. EDUARDO RIVERA ARROYO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SA DE CV**  
**PERSONA MORAL**  
**PRESENTE.**

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA

**UBICACIÓN:** CALLE FRANCISCO MURGUÍA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE

**LOCALIDAD:** FRANCISCO VILLA

**MUNICIPIO:** SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 30 DÍAS

**INICIO DE OBRA:** 31 DE JULIO DE 2025

**TERMINACIÓN DE LA OBRA:** 29 DE AGOSTO DE 2025

- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 25 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

**ATENTAMENTE**  
**SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,**  
**A 21 DE JULIO DE 2025**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO.**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**

ARCHIVO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Plaza de la Constitución No. 1  
TELÉFONO DE OFICINA 748 688 4899  
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
TELÉFONO DE OFICINA 748 688 4899  
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
TELÉFONO DE OFICINA 748 688 4899  
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**ARQ. FIDEL FEDERICO FERNÁNDEZ TELIS**  
**PERSONA FÍSICA**  
**PRESENTE.**

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA

**UBICACIÓN:** CALLE FRANCISCO MURGUÍA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE

**LOCALIDAD:** FRANCISCO VILLA

**MUNICIPIO:** SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 30 DÍAS

**INICIO DE OBRA:** 31 DE JULIO DE 2025

**TERMINACIÓN DE LA OBRA:** 29 DE AGOSTO DE 2025

- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 25 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

**ATENTAMENTE**  
**SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,**  
**A 21 DE JULIO DE 2025**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRÓ.**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
Plaza de la Constitución No. 1  
TELÉFONO DE OFICINA: 0246 688 4390  
DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230  
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com

TLAXCALA TLAX A; JULIO 25 DE 2025  
**ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACION**


**LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE**  
**SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS**  
**P R E S E N T E.**

EL QUE SUSCRIBE C. EDUARDO RIVERA ARROYO EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA PROYEDSA URBANIZACION Y EDIFICACION SA. DE C.V., ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA CONFIRMARLE MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA OBRA REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA, CONSISTENTE EN PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, HERRERIA, REHABILITACION DEL TREN DE DESCARGA, COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL, REHABILITACION DE OFICINA Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN: CALLE FRANCISCO MURGIA S/N, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX, PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA DEL 31 DE JULIO DE 2025 AL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025 (30 DÍAS NATURALES.)

SIN MAS POR EL MOMENTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. EDUARDO RIVERA ARROYO



C.C.P. ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO.- DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SANTORUM  
C.C.P. ARCHIVO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



ARQ, MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ

RFC: ZEDM670910SF2

TLAXCALA TLAX A; 24 DE JULIO DE 2025

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO ME DITIJO A USTED, PARA INFORMARLE MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA OBRA REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA, CONSISTENTE EN PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, HERRERIA, REHABILITACION DEL TREN DE DESCARGA, COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL, REHABILITACION DE OFICINA Y OBRA COMPLEMENTARIA, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN EL DÍA DEL 31 DE JULIO DE 2025 Y TERMINARLA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025, UBICADA EN CALLE FRANCISCO MURGIA S/N EN LA LOCALIDAD: DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED Y LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ



C.C.P. ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO. - DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS. - MUNICIPIO DE SANTORUM. - PRESENTE  
C.C.P. ARCHIVO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM



SINDICATURA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM



TESORERÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

TLAXCALA TLAX A; JULIO 24 DE 2025

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
**PRESENTE.**

POR ESTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA DARLE A CONOCER MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA OBRA DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS QUE CONSISTE EN LA REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA, CONSISTENTE EN PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, HERRERIA, REHABILITACION DEL TREN DE DESCARGA, COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL, REHABILITACION DE OFICINA Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN CALLE FRANCISCO MURGIA S/N, DE LA MISMA LOCALIDAD.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED Y LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

CONSTRUCCIONES "FERZAR"

ARQ. FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS  
C.P. 90105  
PERSONA FISICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CCP. ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**C. EDUARDO RIVERA ARROYO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SA DE CV**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente y a través del Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlax. Y con fundamento en los Art. 1, 30-III y 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, referido al monto por Adjudicación Directa, me permito informarle que después de haber llevado a cabo el análisis por parte de la Dirección de Obras Públicas con relación a la presentación de su propuesta para la ejecución de la obra **OPSLC-FAISMUN-2520-008** denominada:

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA

**UBICACIÓN:** CALLE FRANCISCO MURGUÍA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE

**LOCALIDAD:** FRANCISCO VILLA

**MUNICIPIO:** SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 30 DÍAS

**INICIO DE OBRA:** 31 DE JULIO DE 2025

**TERMINACIÓN DE LA OBRA:** 29 DE AGOSTO DE 2025

Me es grato poner de su conocimiento que, su empresa ha presentado la propuesta que reúne los requisitos técnicos y económicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas. Por tal motivo se le adjudica el contrato correspondiente a dicha obra y se le solicita presentarse en las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas el día 30 de julio del 2025, ubicada en la Plaza de la Constitución No. 1 del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas Tlax., para celebrar el contrato.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,**  
**A 28 DE JULIO DE 2025**

**DR. IVONNE RIVERA CARRO,**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

ARCHIVO  
PRESENCIA PARA LA CONSTITUCIÓN No. 1  
TELÉFONO DE OFICINA: 748 688 4330  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

DURACION: 30 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
 FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
 FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
 MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 CABECERA: FRANCISCO VILLA  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA  
 UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE DE NOVIEMBRE  
 CITA CON: OPSLC-FAISMUN-2520-008



INDICATUVA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**Programa Calendarizado de Montos Generales de los Trabajos (Montos)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DíasFecha de calendariotérmino	ago.-2025	Total
<b>PRELIMINARES</b>					
Limpieza de terreno de materiales de construcción incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	m2	1.0005/07/2025	56.0029/08/2025		\$855.04
Arreglo de falso plafon de reticula de suspensión de 61x61 cm. armada a base de suspensión 3.66m, 1.22 y 61cm. ángulo perimetral y placa, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	m2	1.0031/07/2025	20.0019/08/2025	\$331.27	\$331.27
Arreglo de tubería existente a base de perfil tubular de 2x1" cal. 18, sin recuperación fuera de la obra. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	m2	58.4818/08/2025	2.0019/08/2025	\$3,710.56	\$3,710.56
<b>ALBAÑILERIA</b>					
Demolición de muro de block de 12 a 14 cm. altura máxima de 5.00m. a mano, incluye: mano de obra, maniobras locales, acarreos en sitio, herramienta y lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.	m2	1.0005/07/2025	48.0021/08/2025		\$299.76
Demolición de aplanados existente en muros, altura máxima 5.00m. a mano, incluye: mano de obra, maniobras locales, acarreos en sitio, herramienta y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.	m2	3.4731/07/2025	5.0004/08/2025	\$58.68	\$177.07
Aplanado fino en muros, con mortero cemento-calhidra - arena 1:1:5, incluye: remates, emboquillado, acabado con lana metálica, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	m2	72.1605/08/2025	6.0010/08/2025	\$20,360.67	\$20,360.67

**PROVEDSA**  
 Urbanización y  
 Edificación S. de CV.  
 Calle  
 C. EDUARDO RIVERA ARREOLA PUVIACORP S de CV  
 ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA

# MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

CALLE: FRANCISCO VILLA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA

UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE

20 DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008



PROYEDSA

DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025

MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

## Programa Calendarizado de Montos Generales de los Trabajos (Montos)

	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días Fecha de calendario	ago.-2025	jul.-2025	Total
8	m2	246.44	19/08/2025	3.00	36,970.93		\$36,970.93
9	m2	30.52	31/07/2025	5.00		174.11	\$522.50
10	m2	27.70	05/07/2025	6.00		1,753.13	\$1,753.13
11	m2	62.69	10/08/2025	3.00		21,737.13	\$21,737.13
12	m	36.12	12/08/2025	4.00		4,557.47	\$4,557.47
	m2	68.01	16/08/2025	3.00		14,925.84	\$14,925.84

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



C. EDUARDO RIVERA ARROYO  
ADMINISTRADOR UNICO



**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
2024 - 2027



DURACION: 30 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA  
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA  
UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE  
0 DE NOVIEMBRE  
CLAVE: OPSLC-FAISMUN-2520-008

**Programa Calendarizado de Montos Generales de los Trabajos (Montos)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DíasFecha de calendario	ago.-2025	Total
<b>HERRERIA</b>					
Suministro y colocación de herrería a base de perfil tubular de 2x1" cal. 18, separación a cada 0.125 cm, acabado con pintura color autorizado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	1.0020	08/2025	10.0029	08/2025	\$39,773.63
Suministro y colocación de herrería a base de perfil tubular de 2x1" cal. 18, separación a cada 0.125 cm, de sección 4.30 largo x 2.00 de alto, acabado con pintura de esmalte color autorizado por la supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	1.0020	08/2025	9.0028	08/2025	\$18,515.09
Suministro y colocación de puerta de acceso de herrería a base de perfil tubular de 2x1" cal. 18, separación a cada 0.125 cm, de sección 2.00 largo x 1.95 de alto, acabado con pintura de esmalte color autorizado por la supervisión incluye: chapa phillips número 715, cerrojo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	1.0020	08/2025	10.0029	08/2025	\$10,972.22
Suministro y colocación de puerta de acceso de herrería a base de perfil tubular de 2x1" cal. 18, separación a cada 0.125 cm, de sección 2.60 largo x 2.10 de alto, acabado con pintura de esmalte color autorizado por la supervisión incluye: chapa phillips número 715, cerrojo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	1.0020	08/2025	10.0029	08/2025	\$11,305.97



FIRMA

C. EDUARDO RIVERA ARRIAGA  
ADMINISTRADOR UNICO



**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2024 - 2027

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE

20 DE NOVIEMBRE

REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA

DURACION: 30 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

INVITACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008



**Programa Calendarizado de Montos Generales de los Trabajos (Montos)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DíasFecha de calendario	ago.-2025	jul.-2025	Total
pza	1.0020/08/2025	10.0029/08/2025		\$12,159.03		\$12,159.03
<p>Supministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.</p>						
m o	1.0020/07/2025	33.0021/08/2025		\$9,466.42		\$9,466.42
<p>extracción de equipo de bombeo tipo sumergible m o extracción de equipo de bombeo tipo pocera, herramienta especial</p>						
ml	1.0018/08/2025	4.0021/08/2025		\$7,202.59		\$7,202.59
<p> Toma de video grabación del pozo hasta su profundidad total, incluye: vista lateral 360° reparte y video en formato UBS</p>						
20	1.0018/08/2025	2.0019/08/2025		\$26,968.41		\$26,968.41
<p>Rehabilitación y limpieza del pozo para limpiar ADEME incluye: * rehab cepillado del ADEME del pozo, *pistoneo del pozo, *Desazolve del pozo para retirar solidos y lodos, *Aplicación de dispersor de arcillas</p>						
21	1.0018/08/2025	1.0018/08/2025		\$5,656.80		\$5,656.80
<p> Suministro e instalación de guarda motor para protección de bajo y alto voltaje, falla de fase, fase invertida, incluye: cableado, instalación, conexiones y pruebas de funcionamiento</p>						
22	1.0018/08/2025	1.0018/08/2025		\$116,177.43		\$116,177.43
<p> Suministro y puesta en operación de bomba sumergible de acero inoxidable de 50 hp y motor sumergible de 50 hp en marca altamira incluye mano de obra, herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.</p>						



C. EDUARDO RIVERA ARROYO  
ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 2024 - 2027

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
 LOCALIDAD: FRANCISCOVILLA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA

UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE

20 DE NOVIEMBRE

CITACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008

DURACION: 30 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
 FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
 FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
 MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES



**Programa Calendarizado de Montos Generales de los Trabajos (Montos)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DíasFecha de calendario	Fecha de término	ago.-2025	jul.-2025	Total
m2	1.0020	07/2025	2.0021	07/2025		\$3,304.78	\$3,304.78
Revisión de tablero por reporte falla (no arranca equipo de bombeo) se hace una revisión a detalle, pruebas en vacío de arrancador es decir sin conexión de bomba, sin conexión de banco de capacitores, se encuentran puntos calientes es decir conexiones flojas, se procede a apretar tornillería, se encasilla cables lado fuente y lado carga se procede a energizar equipo y se deja funcionando por más de 1 hora sin el banco y 1 hora con el banco de capacitores, funcionando óptimamente, se hace entrega de equipo funcionando al presidente de la comunidad de Franciscovilla incluye: mano de obra calificada							
m o	2.0018	08/2025	1.0018	08/2025	\$2,304.27		\$2,304.27
Bufa marina incluye: conector a tope calibre 2, cinta galvanizada, resina baza, herramienta especial							
pza	1.0018	08/2025	1.0018	08/2025	\$1,667.89		\$1,667.89
Instalación de manómetro con glicerina de caratula de 2.5 pulgadas de 0-21 kg/cm2 con sifon y coples de 1/4"							
m o	1.0018	08/2025	1.0018	08/2025	\$9,466.42		\$9,466.42
Mano de obra instalación de equipo de bombeo tipo sumergible incluye: camión grúa tipo pocera, herramienta especial							
lote	1.0018	08/2025	1.0018	08/2025	\$2,109.67		\$2,109.67
Suministro y aplicación de pintura a base de aceite color autorizado por la supervisión en el tren de descaraga.							
pza	1.0018	08/2025	3.0020	08/2025	\$4,243.68		\$4,243.68
Suministro e instalación de valvula de pie de inyeccion de cloracion de 1/2" con contrapeso							
pza	1.0018	08/2025	1.0018	08/2025	\$3,051.64		\$3,051.64
Suministro e instalacion de valvula de inyeccion para coneccion al tren de descarga de 1/2"							
ml	15.0018	08/2025	1.0018	08/2025	\$0.00		\$0.00
Suministro de mangera de cloracion de 3/8"							
	<b>1.0019</b>	<b>08/2025</b>	<b>4.0022</b>	<b>08/2025</b>			

**ELECTROPROYEDSA**  
 Urbanización y Edificación S. de CV  
 C. EDUARDO RIVERA ARROYO  
 ADMINISTRADOR UNICO R.F.C. PUERTO RICO

FIRMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2024 - 2027

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA

UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE DE NOVIEMBRE  
CITACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008

DURACION: 30 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**Programa Calendarizado de Montos Generales de los Trabajos (Montos)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DíasFecha de calendario	Fecha de término	ago.-2025	Total
LOTES Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAPACIDAD ADECUADA A BOMBA DEL POZO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE OPERACION DE ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE POZO PROFUNDO.	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	4.0022/08/2025		\$18,794.44	\$18,794.44
SUM. Y COL. DE TRAMO CABLE URD 3+1 EN CALIBRE 3/0+1/0 PARA CAMBIARLO POR EL CABLE DAÑADO, CONECTOR RECTO DE 1 1/2 PARA LICUTITE PARA CONEXION DE LA BASE DE MEDIDORAL TERMOMAGNETICO, MAGNA TERMOCONTRACTIL PARA SELLAR CONECTORES BIMETALICOS PARA CALIBRE 2/0Y CALIBRE 2/0Y CABLE URD MULTIPLE DIGITAL EN LADO FUENTE Y LADO MULTIPLE PARA COMPLETAR CABLE DAÑADO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025		\$5,524.66	\$5,524.66
REVISION DE LISTON FUSIBLES DE LAS CANILLAS DE ENTRONQUE Y LOTE DE CUCHILLAS DE TRANSFORMADOR REVISANDO CONTINUIDAD APERTURA Y CIERRE CANILLAS, EN EL ARRANCADOR ATR DE 50 HP, REVISANDO VOLTAJES Y CORRIENTES CON MULTIMETRO DIGITAL EN LADO FUENTE Y LADO CARGA BOMBA DEL POZO, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025		\$3,339.32	\$3,339.32
SUM. YCOL. DE TUBERIA CONDUIT P/GDE 2", DE TUBO LICUTITE DE LOTE CONECTOR RECTO DE 2" CABLE THW CAL. 10, CODO P/G 2", UNICAL DE 2*4, ABRAZADERA PARA UNICAL	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	2.0020/08/2025		\$30,413.25	\$30,413.25

**PROYEDSA**  
Urbanización y Elifricación S. de CV  
C. EDUARDO RIVERA ARROYO  
ADMINISTRADOR UNICO  
PUY120815J04

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

INDICATUVA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2024 - 2027

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.

LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA

UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE

20 DE NOVIEMBRE

CITACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008

DURACION: 30 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**Programa Calendarizado de Montos Generales de los Trabajos (Montos)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DíasFecha de calendariotérmino	jul.-2025	ago.-2025	Total
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025		\$22,504.93	\$22,504.93
Y COLOCACION DE BANCO DE CAPACITADORES FIJO DE LOTE CAPACIDAD ADECUADA PARA CORREGIRBAJO DEL FACTOR DE POTENCIA PARA EVITAR PENALIZACION, ECONOMICA, A 440V. MATERIALES ADICIONALES PARA SU COLOCACION, TRAMO DE TUBO, CONDUIT DE 2 ", CONTRA Y MONITOR INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO						
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	\$10,300.00		\$10,300.00
PAGO A CFE POR APERTURA DE CANDADOS EN MURETE Y LIBRANZA						
PZA	1.0020/08/2025	1.0020/08/2025	1.0020/08/2025		\$489.53	\$489.53
COLOCACION DE PLACA MDS PARA LA IDENTIFICACION PROVENIENTE DEL FAISMUN 2025 EL CUAL ESTA NORMADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR INCLUYE CONTENIDO Y LEYENDA QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA P.U.O. T						



C. EDUARDO RIVERA ARROYO  
ADMINISTRADOR UNICO

Total parcial: \$6,626.89 \$475,286.55  
Total acumulado: \$6,626.89 \$481,913.44

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

SINDICATO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

MES DEL ASESORADO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE

20 DE NOVIEMBRE  
CITACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008

DURACION: 30 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES



**Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos (Volumenes Mensuales y Plazo de Ejecucion)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término
<b>PRELIMINARES</b>				
Limpieza de terreno de materiales de construcción incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	1.0005/07/2025	56.0029/08/2025		
Retiro de falso plafon de reticula de suspensión de 61x61 cm. armada a base de suspensión 3.66m, 1.22 y 61cm. ángulo perimetral y placa, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	1.0031/07/2025	20.0019/08/2025		
Retiro de falso plafon de reticula de suspensión de 61x61 cm. armada a base de suspensión 3.66m, 1.22 y 61cm. ángulo perimetral y placa, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	64.3931/07/2025	1.0031/07/2025		
Retiro de falso plafon de reticula de suspensión de 61x61 cm. armada a base de suspensión 3.66m, 1.22 y 61cm. ángulo perimetral y placa, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	11.2631/07/2025	1.0031/07/2025		
Demolicion de muro de block de 12 a 14 cm. altura máxima de 5.00m. a mano, incluye: mano de obra, maniobras locales, acarreos en sitio, herramienta y lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.	58.4818/08/2025	2.0019/08/2025		
Demolicion de aplanados existente en muros, altura máxima 5.00m. a mano, incluye: mano de obra, maniobras locales, acarreos en sitio, herramienta y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.	1.0005/07/2025	48.0021/08/2025		
Demolicion de aplanados existente en muros, altura máxima 5.00m. a mano, incluye: mano de obra, maniobras locales, acarreos en sitio, herramienta y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.	9.4531/07/2025	3.0002/08/2025		
Demolicion de aplanados existente en muros, altura máxima 5.00m. a mano, incluye: mano de obra, maniobras locales, acarreos en sitio, herramienta y todo lo necesario para su ejecución, p.u.o.t.	3.4731/07/2025	5.0004/08/2025		
Aplanado fino en muros, con mortero cemento-calhidra - arena 1:1:5, incluye: remates, emboquillado, acabado con llana metálica, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	72.1605/08/2025	6.0010/08/2025		

**PROYEDSA**  
Urbanización y  
Elevación S. de C. S. de C.

C. EDUARDO RIVERA ARROYO  
ADMINISTRADOR TÉCNICO  
R.F.C. PJJV1809143023

FIRMA

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 2024 - 2027



**DURACION:** 30 DIAS NATURALES  
**FECHA DE INICIO:** 31 DE JULIO DE 2025  
**FECHA DE TERMINO:** 29 DE AGOSTO DE 2025  
**FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:** 28 DE JULIO DE 2025  
**MODALIDAD:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**MUNICIPIO:** SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
**UBICACION:** CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE DE NOVIEMBRE  
**CITACION:** OPSL/C-FAISMUN-2520-008



**Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos (Volumenes Mensuales y Plazo de Ejecucion)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DiasFecha de calendario	Fecha de término
m2	246.4419/08/2025	3.0021/08/2025	3.0021/08/2025	ago.-2025
m2	30.5231/07/2025	5.0004/08/2025	5.0004/08/2025	
m2	27.7005/07/2025	6.0010/07/2025	6.0010/07/2025	
m2	62.6910/08/2025	3.0012/08/2025	3.0012/08/2025	
m	36.1212/08/2025	4.0015/08/2025	4.0015/08/2025	
m2	68.0116/08/2025	3.0018/08/2025	3.0018/08/2025	

**1.0020/08/2025**      **10.0029/08/2025**

**HERRERIA**  
**PROYEDSA**  
 Urbanización y  
 Edificación S. de CV  
 Calle  
**C. EDUARDO RIVERA ARROYO**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**





**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
2024 - 2027



DURACION: 30 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025  
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025  
MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE  
2009 NOVIEMBRE  
INVITACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008



**Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos (Volumenes Mensuales y Plazo de Ejecucion)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio calendario	Fecha de término calendario	Días
Suministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0020	08/2025	10.0029	ago-2025
Suministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0020	07/2025	33.0021	ago-2025
Suministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0018	08/2025	1.0018	ago-2025
Suministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0018	08/2025	4.0021	ago-2025
Suministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0018	08/2025	2.0019	ago-2025
Suministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0018	08/2025	1.0018	ago-2025
Suministro y colocación de rejacero en paneles con varilla en calibre 6 (4.89 mm.), de 0.63 a 2.00 m. de altura, y largo 3.35 m., de 2 a 5 pliegues, con una capa de zinc de 100 gr/m2 min. y espesor de poliester 100 micras min., postes calibre 16 de 21/4" x 21/4" (57x57mm.), abrazaderas de 2 a 5 por poste (alt. poste 1.00, alt. panel 0.63, abraz. 2 - alt. poste 3.10, alt. panel 2.00, abraz. 5), incluye: equipo, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0018	08/2025	1.0018	ago-2025

FIRMA

**PROVEDSA**  
Urbanización y Edificación S.A. de C.V.  
Calle...  
C. EDUARDO RIVERA ARROYO  
ADMINISTRADOR UNICO



**DURACION:** 30 DIAS NATURALES  
**FECHA DE INICIO:** 31 DE JULIO DE 2025  
**FECHA DE TERMINO:** 29 DE AGOSTO DE 2025  
**FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:** 28 DE JULIO DE 2025  
**MODALIDAD:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
**NOBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA  
**UBICACION:** CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE  
 20 DE NOVIEMBRE  
**LICITACION:** OPSLC-FAISMUN-2520-008

**Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos (Volumenes Mensuales y Plazo de Ejecucion)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	DiasFecha de calendario de término	ago-2025	jul.-2025	ago-2025
m2	1.0020	07/2025	2.0021/07/2025	0	0	0
m o	2.0018	08/2025	1.0018/08/2025	0	0	0
pza	1.0018	08/2025	1.0018/08/2025	0	0	0
m o	1.0018	08/2025	1.0018/08/2025	0	0	0
lote	1.0018	08/2025	1.0018/08/2025	0	0	0
pza	1.0018	08/2025	3.0020/08/2025	0	0	0
pza	1.0018	08/2025	1.0018/08/2025	0	0	0
ml	15.0018	08/2025	1.0018/08/2025	0	0	0
<b>ELECTRICO</b>	<b>1.0019</b>	<b>08/2025</b>	<b>4.0022/08/2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROVEDSA**  
**Urbanización y**  
**Edificación S. de CV**  
**C. EDUARDO RIVERA ARROYO**  
**ADMINISTRADOR UNICO S.F.C. PROVEDSA**

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**2024 - 2027**



**DURACION:** 30 DIAS NATURALES  
**FECHA DE INICIO:** 31 DE JULIO DE 2025  
**FECHA DE TERMINO:** 29 DE AGOSTO DE 2025  
**FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA:** 28 DE JULIO DE 2025  
**MODALIDAD:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
**CALIDAD: FRANCISCO VILLA**

**TITULO DE LA OBRA:** REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA  
**UBICACION:** CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE  
**20 DE NOVIEMBRE**

**IDENTIFICACION:** OPSLC-FAISMUN-2520-008



**Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos (Volumenes Mensuales y Plazo de Ejecucion)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Dias Fecha de calendario	Fecha de término
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	4.0022/08/2025	ago.-2025
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	2.0020/08/2025	
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	

SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAPACIDAD ADECUADA A BOMBA DEL POZO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE OPERACION DE ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE POZO PROFUNDO.

SUM. Y COL. DE TRAMO CABLE URD 3+1 EN CALIBRE 3/0+1/0 PARA CAMBIARLO POR EL CABLE DANADO, CONECTOR RECTO DE 1.1/2 PARA LICUTITE PARA CONEXION DE LA BASE DE MEDIDORAL TERMOMAGNETICO, MAGNA TERMOCNTRACTIL PARA SELLAR EMPALME CONECTORES BIMETALICOS PARA CALIBRE 2/0Y CALIBRE URD MULTIPLE DIGITAL EN LADO FUENTE Y LADO CARGA MULTIPLE PARA COMPLETAR CABLE DANADO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA

REVISION DE LISTON FUSIBLES DE LAS CANILLAS DE ENTRONQUE Y DE CUCHILLAS DE TRANSFORMADOR REVISANDO CONTINUIDAD APERTURA Y CIERRE CANILLAS, EN EL ARRANCADOR ATR DE 50 HP, REVISANDO VOLTAJES Y CORRIENTES CON MULTIMETRO DIGITAL EN LADO FUENTE Y LADO CARGA BOMBA DEL POZO, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA

SUM. YCOL. DE TUBERJA CONDUIT P/GDE 2", DE TUBO LICUTITE DE CONECTOR RECTO DE 2" CABLE THW CAL. 10, CODO P/G 2", UNICAL DE 2\*4, ABRAZADERA PARA UNICAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE CAPACITADORES FIJO DE CAPACIDAD ADECUADA PARA CORREGIRDEBAJO DEL FACTOR DE POTENCIA PARA EVITAR PENALIZACION, ECONOMICA, A 440V. MATERIALES ADICIONALES PARA SU COLOCACION, TRAMO DE TUBO, CONDUIT DE 2", CONTRA Y MONITOR. INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO



**PROVEDSA**  
**Urbanización y**  
**Elificación s. r. l. c. v.**  
**Cal.**  
**C. EDUARDO RIVERA ARROYO**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**2024 - 2027**

**FIRMA**



**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 2024 - 2027

**MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
**CALIDAD: FRANCISCO VILLA**

**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE No. 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA**  
**UBICACION: CALLE FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE**

**CITACION: OPSLC-FAISMUN-2520-008**

**DURACION: 30 DIAS NATURALES**  
**FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025**  
**FECHA DE TERMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025**  
**FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 28 DE JULIO DE 2025**  
**MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES**



**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.**  
 2024 - 2027



**TRESORERIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos (Volumenes Mensuales y Plazo de Ejecucion)**

Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de termino	Dias calendario
LOTE	1.0019/08/2025	1.0019/08/2025	ago.-2025	0
PLACA MDS	1.0020/08/2025	1.0020/08/2025	ago.-2025	1
PZA	1.0020/08/2025	1.0020/08/2025	ago.-2025	1


**PAGO A CFE POR APERTURA DE CANDADOS EN MURETE Y LIBRANZA**  
**SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MDS PARA LA IDENTIFICACION DEL RECURSO PROVENIENTE DEL FAISMUN 2025 EL CUAL ESTA NORMADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR INCLUYE CONTENIDO LEYENDA QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA**



**PROYEDSA**  
 Urbanización y  
 Eliminación de...

**C. EDUARDO RIVERA AR...**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA



**AYUNTAMIENTO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAX.  
EXPEDIENTE TECNICO 2025  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)**



**1.- INFORMACIÓN BÁSICA**

EXPEDIENTE:       FECHA DE ELABORACION:   
 CLAVE:       MIDS

**A.- UBICACION**

CALLE:   
 LOCALIDAD:   
 ENTRE LAS CALLES:

**B.- OBRA A REALIZAR**

NOMBRE DE LA OBRA:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CANTIDAD :       UNIDAD MEDIDA:

**C. CATALOGO DE OBRAS Y ACCIONES**

INCIDENCIA DEL PROYECTO:   
 RUBRO DE INVERSIÓN:   
 TIPO DE OBRA:   
 MODALIDAD DEL PROYECTO:

**D.- BENEFICIARIOS**

N° BENEFICIARIOS DIRECTOS       N° HAB. DE LA LOCALIDAD:

**E.- INVERSIÓN**

COSTO TOTAL DE LA OBRA :

MUNICIPIO	\$ 673,739.75	BENEFICIARIOS	\$0.00
	100.00%		0.00%

FORMA DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS:

**F.- EJECUCIÓN**

MODALIDAD:   
 PERIODO:

DEPENDENCIA EJECUTORA.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO

**LIC. IVAN ALEJANDRO ALEMAN JUAREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO**  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

## 2.- CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA

CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-008
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA
UBICACIÓN:	FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO

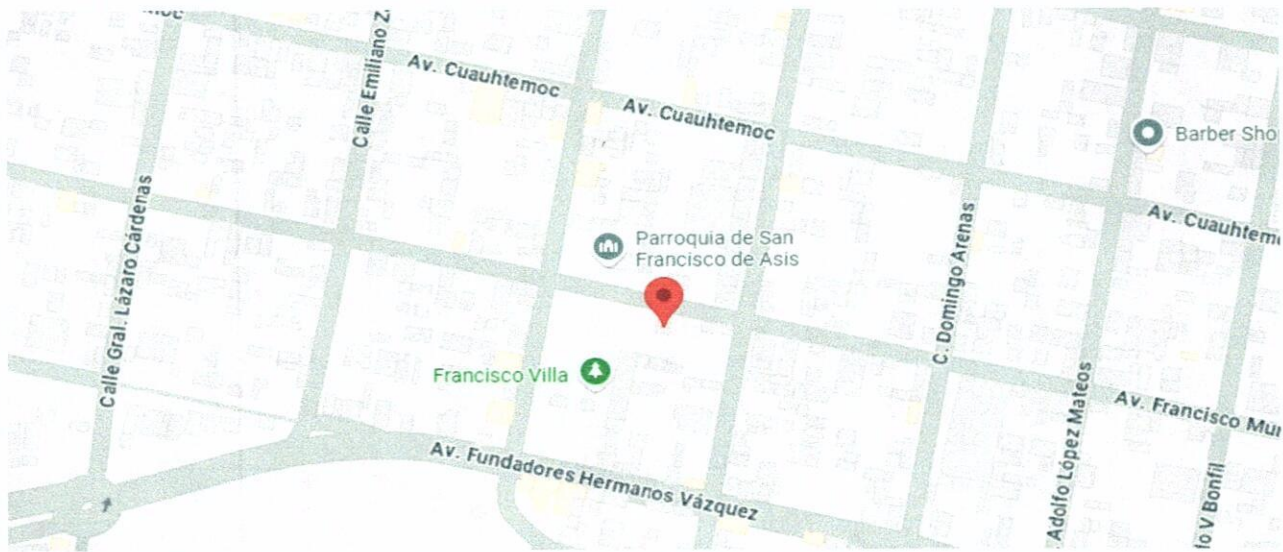

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027




**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

### 3.- CROQUIS DE DETALLE

CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-008
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA
UBICACIÓN:	FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO

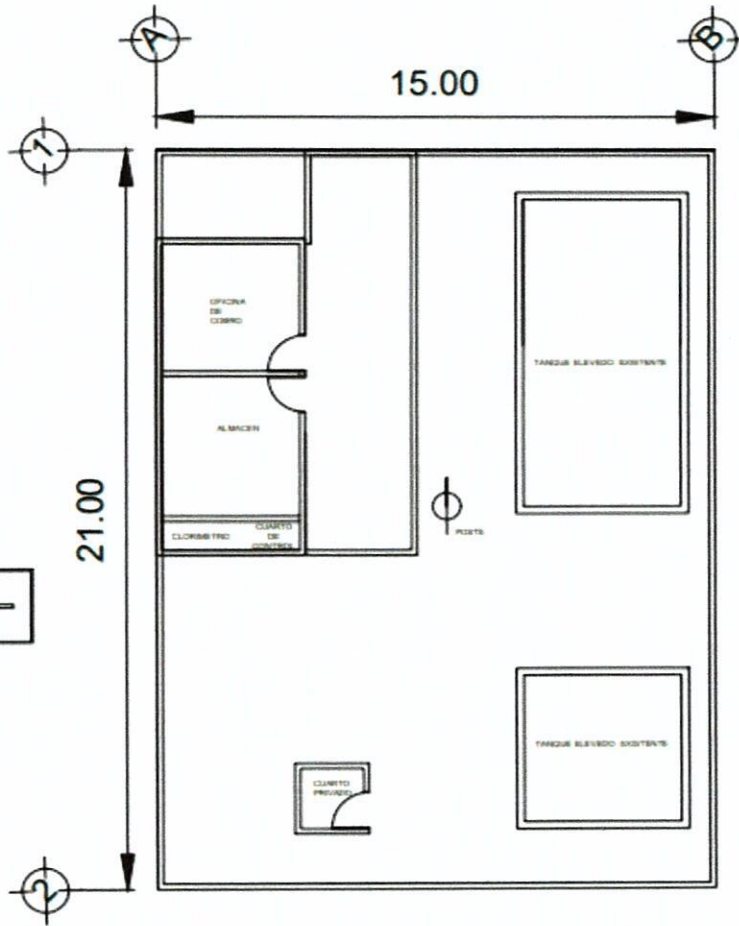

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA					
CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-008				
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS				
LOCALIDAD:	SANCTORUM				
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA				
UBICACIÓN:	FRANCISCO MURGUIA SIN NUMERO				
CLAVE:	CONCEPTO O PARTIDA	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>				
1	LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	63.43	\$16.84	\$1,068.16
2	RETIRO DE FALSO PLAFON DE RETÍCULA DE SUSPENSIÓN DE 61X61CM ARMADA BASE DE SUSPENSIÓN 3.66M, 1.22Y61CM. ÁNGULO PERIMETRAL Y PLACA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	11.32	\$67.70	\$766.36
3	RETIRO DE HERRERÍA EXISTENTE A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2X1" CAL. 18, SIN RECUPERACIÓN FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	69.17	\$74.51	\$5,153.86
					<b>\$6,988.38</b>
	<b>ALBAÑILERIA</b>				
4	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	4.00	\$99.95	\$399.80
5	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EXISTENTE EN MUROS, ALTURA MÁXIMA 5.00 M., A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	32.65	\$74.96	\$2,447.44
6	APLANADO FINO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO, ACABADO CON LLANA METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	104.75	\$336.94	\$35,294.47
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN, MARCA VERLA DOS MANOS Y SELLADOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, REBABEO Y ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	281.60	\$138.48	\$38,995.97
8	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO CON FLORA EN VENTANAS Y PUERTAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M	33.61	\$152.27	\$5,117.79
9	ENTORTADO EN AZÓTEA DE 10CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON CEMENTO-CACAHUATILLO-ARENA, A REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	62.95	\$329.76	\$20,758.39
10	CHAFLÁN PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M	35.22	\$152.26	\$5,362.60
	IMPERMEABILIZANTE ACABADO APARENTE C/GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: PRIMARIO ASFÁLTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO MULTICAPA DE PAVIMENTO MODIFICADO SBS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		66.47	\$224.37	\$14,913.87
					<b>\$123,290.33</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS  
 2024 - 2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAJ.  
 2024 - 2027

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAJ.  
 2024 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAJ.  
 2024 - 2027

HERRERIA					
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2X1" CAL.18, SEPARACIÓN A CADA 0.125 CM, ACABADO CON PINTURA COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2.	45.28	\$2,436.87	\$110,341.47
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2X1" CAL. 18, SEPARACIÓN A CADA 0.125 CM, DE SECCIÓN 4.30 LARGO X 2.00 DE ALTO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$17,833.71	\$17,833.71
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2X1" CAL. 18, SEPARACIÓN A CADA 0.125 CM, DE SECCIÓN 2.00 LARGO X 1.95 DE ALTO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: CHAPA PHILLIPS NÚMERO 715, CERROJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	PZA.	1.00	\$14,244.92	\$14,244.92
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2X1" CAL. 18, SEPARACIÓN A CADA 0.125 CM, DE SECCIÓN 2.00 LARGO X 2.20 DE ALTO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: CHAPA PHILLIPS NÚMERO 715, CERROJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	PZA.	1.00	\$15,572.66	\$15,572.66
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2X1" CAL. 18, SEPARACIÓN A CADA 0.125 CM, DE SECCIÓN 2.60 LARGO X 2.10 DE ALTO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: CHAPA PHILLIPS NÚMERO 715, CERROJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$14,789.16	\$14,789.16
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO EN PANELES CON VARILLA EN CALIBRE 6 (4.89 MM.), DE 0.63 A 2.00 M. DE ALTURA, Y LARGO 3.35 M., DE 2 A 5 PLIEGUES, CON UNA CAPA DE ZINC DE 100 GR/M2 MIN. Y ESPESOR DE POLIÉSTER 100 MICRAS MIN., POSTES CALIBRE 16 DE 21/4" X 21/4" (57X57MM.), ABRAZADERAS DE 2 A 5 POR POSTE (ALT. POSTE 1.00, ALT. PANEL 0.63, ABRAZ. 2- ALT. POSTE 3.10, ALT. PANEL 2.00, ABRAZ. 5), INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	PZA.	1.00	\$10,606.26	\$10,606.26
				<b>\$183,388.18</b>	



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

	TREN DE DESCARGA				
18	MANO DE OBRA POR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE INCLUYE: CAMIÓN GRÚA TIPO POCERA, HERRAMIENTA ESPECIAL	LOTE	1.00	\$10,904.68	\$10,904.68
19	TOMA DE VIDEO GRABACIÓN DEL POZO HASTA SU PROFUNDIDAD TOTAL, INCLUYE: VISTA LATERAL 360° REPORTE Y VIDEO EN FORMATO UBS	ML.	2.00	\$13,367.36	\$26,734.72
20	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL POZO PARA LIMPIAR ADEME INCLUYE: *CEPILLADO DEL ADEME DEL POZO,*PISTONEO DEL POZO,*DESZOLVE DEL POZO PARA RETIRAR SÓLIDOS Y LODOS,*APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS	LOTE	1.00	\$45,303.44	\$45,303.44
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA MOTOR PARA PROTECCIÓN DE BAJO Y ALTO VOLTAJE, FALLA DE FASE, FASE INVERTIDA, INCLUYE: CABLEADO, INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	PZA.	1.00	\$10,103.66	\$10,103.66
22	MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE DE FABRICACIÓN EN ACERO INOX. DE LA MARCA ALTAMIRAY/OSIMILAREN DESCARGA EN 4" CON MOTOR ACOPLADO DE 50HPA 440V TRIFÁSICO DE LA MARCA ALTAMIRAY/OSIMILAR PARA UN GASTO DE 11L.PS	PZA.	1.00	\$21,358.45	\$21,358.45
23	FABRICACIÓN DE MUFA MARINA INCLUYE: CONECTOR A TOPE CALIBRE # 2, CINTA AHULADA Y CINTA VULCANIZADA, RESINABAZA, HERRAMIENTA ESPECIAL	PZA.	1.00	\$2,672.86	\$2,672.86
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CON GLICERINA DE CARATULA DE 2.5 PULGADAS DE 0-21KG/CM2 CON SIFÓN Y COPLES DE 1/4"	PZA.	1.00	\$2,972.17	\$2,972.17
25	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE INCLUYE: CAMIÓN GRÚA TIPO POCERA, HERRAMIENTA ESPECIAL	PZA.	1.00	\$12,585.04	\$12,585.04
26	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN EN EL TREN DE DESCARGA.	LOTE	1.00	\$5,713.68	\$5,713.68
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE DE INYECCIÓN DE CLORACIÓN DE 1/2" CON CONTRAPESO.	PZA.	1.00	\$4,152.53	\$4,152.53
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE INYECCIÓN PARA CONEXIÓN AL TREN DE DESCARGA DE 1/2"	PZA.	1.00	\$4,121.88	\$4,121.88
29	SUMINISTRO DE MANGUERA DE CLORACIÓN DE 1/8	ML.	15	137.84	\$2,067.60
					\$148,690.71



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

	ELECTRICO				
30	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAPACIDAD ADECUADA ABOMBA DEL POZO INCLUYE:MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE OPERACIÓN DE ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE POZO PROFUNDO.	LOTE	1.00	20705.65	\$20,705.65
31	SUM. Y COL. DE TRAMO CABLE URD3 1ENCALIBRE3/0+1/0 PARA CAMBIARLO POR EL CABLE DAÑADO ,CONECTOR RECTO DE 1 1/2 PARA LICUITITE PARA CONEXION DE LA BASE DE MEDIDOR AI TERMOMAGNETICO, MAGNA TERMO CONTRACTIL PARA SELLAR EMPALMES, CONECTORES BIMETALICOS PARA CALIBRE 2/0 Y CALIBRE 2, TRAMO DE CABLE URD MULTIPLE DIGITAL EN LADO FUENTE Y LADO CARGA URD MULTIPLE PARA COMPLETAR CABLE DAÑADO INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA	LOTE	1.00	5124.49	\$5,124.49
32	REVISION DE LISTON FUSIBLES DE LAS CANILLAS DE ENTRONQUE Y DE CUCHILLAS DE TRANSFORMADOR REVISANDO CONTINUIDAD APERTURA Y CIERRE CANILLAS, EN EL ARRANCADOR ATR DE 50 HP, REVISANDO VOLTAJES Y CORRIENTES CON MULTIMETRO DIGITAL EN LADO FUENTE Y LADO CARGA BOMBA DEL POZO,INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA	LOTE	1.00	4352.85	\$4,352.85
33	SUM. YCOL. DE TUBERIA CONDUIT P/GDE 2", DE TUBO LICUITITE DE CONECTOR RECTO DE 2" CABLE THW CAL. 10, CODO P/G 2", UNICAL DE 2*4, ABRAZADERA PARA UNICAL	LOTE	1.00	46114.80	\$46,114.80
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE CAPACITADORES FUJO DE CAPACIDAD ADECUADA PARA CORREGIRDEBAJO DEL FACTOR DE POTENCIA PARA EVITAR PENALIZACION, ECONOMICA, A 440V. MATERIALES ADICIONALES PARA SU COLOCACION, TRAMO DE TUBO, CONDUIT DE 2 ", CONTRA Y MONITOR INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO	LOTE	1.00	31831.06	\$31,831.06
35	PAGO A CFE POR APERTURA DE CANDADOS EN MURETE Y LIBRANZA	LOTE	1.00	10323.68	\$10,323.68

	\$118,452.52
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$580,810.13</b>
<b>IVA</b>	<b>\$92,929.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$673,739.75</b>



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**6.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES**

CLAVE:	OPSLC-FAISMUN-2520-008				
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS				
LOCALIDAD:	FRANCISCO VILLA				
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA				
UBICACIÓN:	FRANCISCO MURGUJA SIN NUMERO				
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES					
PRELIMINARES	10.00%				
ALBAÑILERIA	20.00%				
HERRERIA	25.00%				
TREN DE DESCARGA	25.00%				
ELECTRICAL	20.00%				
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>				



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**PRESIDENCIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**SECRETARÍA**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**SECRETARÍA**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
(FAISMUN 2025)**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
DE CONTRATISTAS - AYUNTAMIENTO**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO OPSLC-FAISMUN-2520-008

EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL AYUNTAMIENTO Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

**MUNICIPIO:** SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

**LOCALIDAD:** FRANCISCO VILLA

**NUMERO DE OBRA:** OPSLC-FAISMUN-2520-008

**INCIDENCIA DEL PROYECTO:** AGUA POTABLE

**RUBRO:** POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

**SUBCLASIFICACIÓN:** EQUIPAMIENTO

**MODALIDAD:** DIRECTA

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE # 1 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA

**UBICACIÓN:** CALLE FRANCISCO MURGUÍA SIN NUMERO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE

INVERSIÓN PROGRAMADA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS
\$ 563,936.77			\$ 563,936.77		

INVERSIÓN EJERCIDA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS
\$ 682,174.98			\$ 682,174.98		

META PROGRAMADA		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
POZO	1.00	

META REAL EJECUTADA		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
POZO	1.00	

**PREROGATIVA MUNICIPAL**  
Plaza de la Constitución No. 1  
Teléfono de Oficina: 748 688 4330  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230  
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com  
2024 - 2027



# CONTIGO ES POSIBLE SANCTORUM

de Lázaro Cárdenas

**FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS: SIN APORTACIÓN**

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2025**

**FECHA DE TÉRMINO: 29 DE AGOSTO DE 2025**

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMADA PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 10:45 HRS DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

### RECIBE

**POR EL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.

**LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO

**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO**  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

**ENTREGA PROYEDSA**

Urbanización y Edificación SA DE CV

**C. EDUARDO RIVERA ARROYO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**PROYEDSA URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SA DE CV**  
CONTRATISTA



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Ayuntamiento de Sanctorum  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM**  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM**  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230  
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com
